

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.07-01-19.06

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na **KARCIE OCENY** w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. **KARTĘ OCENY** przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment podłogi z paneli podłogowych i wykładziny dywanowej na przygotowanym podłożu. Podłogę z paneli wykonaj jako pływającą. Usytuowanie i układ posadzek przedstawiono na rysunku.

Pod panele podłogowe wykonaj izolację przeciwwilgociową z folii paroizolacyjnej oraz izolację akustyczną z pianki podkładowej.

Po wykonaniu każdej z izolacji zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie wykonywania dalszych prac.


Ułóż panele podłogowe oraz wykładzinę dywanową. Wykładzinę przymocuj do podłoża dwustronną taśmą klejącą.

Po wykonaniu posadzek zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie wykonywania dalszych prac.

Posadzkę z paneli wykończ przy ścianach listwami przypodłogowymi. Na styku paneli i wykładziny zamontuj listwę dylatacyjną.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku egzaminacyjnym. Prace wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót posadzkarskich. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i uporządkuj stanowisko. Odpady posegreguj i umieść w odpowiednich pojemnikach.

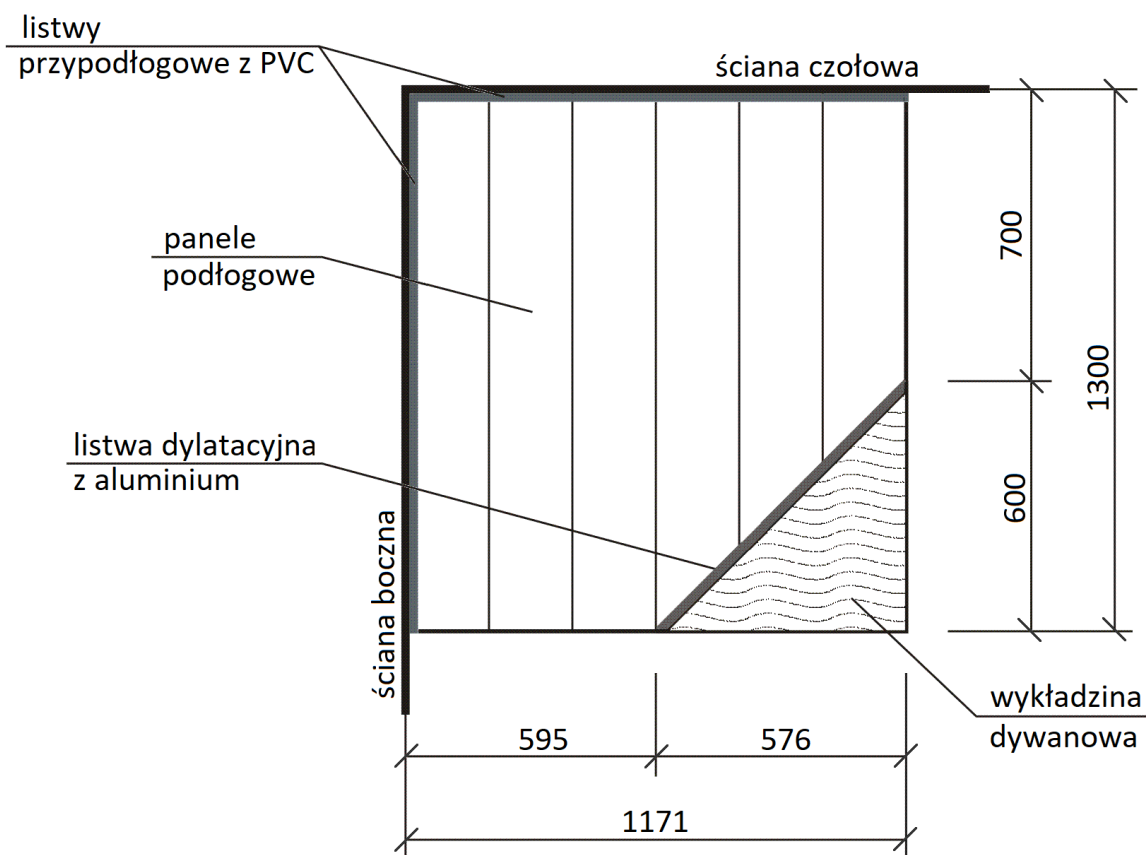

Rysunek. Usytuowanie i układ posadzek – fragment podłogi łączonej

Wymiary [mm]

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich (wyciąg)

- izolacja przeciwwilgociowa z folii paroizolacyjnej ułożona na zakładkę - bez sklejania, minimalna szerokość zakładki 200 mm,
- izolacja akustyczna z pianki podkładowej ułożona na styk,
- usytuowanie posadzek względem ścian zgodne z dokumentacją rysunkową, dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ± 20 mm,
- między ścianami a posadzką zachowane szczeliny dylatacyjne o szerokości $10 \div 20$ mm,
- układ paneli podłogowych i wykładziny dywanowej zgodny z dokumentacją rysunkową,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi posadzek od linii prostej nie większe niż 2 mm/1 m,
- dopuszczalne odchylenie narożników posadzek od kąta prostego nie większe niż 1 mm/1 m,
- powierzchnia posadzki z paneli podłogowych jest równa i gładka bez widocznych szczelin,
- brak zabrudzeń i pofałdowania posadzki,
- brak uszkodzeń mechanicznych posadzki,
- listwy przypodłogowe na całej długości dokładnie przylegają do ściany i paneli,
- listwy przypodłogowe w narożniku połączone elementem narożnym,
- listwy przypodłogowe na zakończeniach docięte równo z posadzką, powierzchnia cięcia wykończona elementem maskującym,
- listwa dylatacyjna na całej długości dokładnie przylega do paneli i wykładziny dywanowej,
- listwa dylatacyjna na zakończeniach docięta do kształtu posadzki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- izolacja przeciwwilgociowa i akustyczna,
 - posadzka z paneli podłogowych,
 - posadzka z wykładziny dywanowej,
 - zamontowane listwy przypodłogowe i listwa dylatacyjna
- oraz
- przebieg wykonania podłogi.
